

Cronograma

Cronograma da **equipe de Desenvolvimento** (9 integrantes), montado sobre o calendário do case:

Data	Quem	O que acontece
03/08/2026	Stakeholders	definem os requisitos (linha de base: Documento de Requisitos v2.0)
13/08/2026	Auditores	definem os indicadores para avaliar o cumprimento dos requisitos
15/09/2026	Desenvolvedores · Stakeholders	sprint parcial 1: equipe apresenta o andamento; Stakeholders julgam solicitações de mudança
22/09/2026	Desenvolvedores · Stakeholders	sprint parcial 2: idem
29/09/2026	Desenvolvedores · Auditores	entrega do sistema; Auditores auditam com base nos indicadores de 13/08
05/10/2026	Auditores · Stakeholders	parecer de conformidade e aprovação ou reprovação da entrega

Dias úteis entre a linha de base e a entrega: 40 (segunda a sexta, sem o feriado de 07/09).

Marcos

Marco	Data	Critério
M0 — Requisitos definidos	seg 03/08/2026	Documento de Requisitos v2.0 recebido dos Stakeholders
M1 — Indicadores de auditoria	qui 13/08/2026	framework de avaliação dos Auditores recebido; roteiro de verificação da matriz de rastreabilidade alinhado a ele
M2 — Sprint parcial 1	ter 15/09/2026	backend, frontend, banco e GeoServer funcionando; mudanças julgadas pelos Stakeholders
M3 — Sprint parcial 2	ter 22/09/2026	correções da sprint 1 aplicadas; testes e documentação apresentados
M4 — Entrega e auditoria	ter 29/09/2026	sistema, documentação e evidências entregues aos Auditores
M5 — Parecer e decisão	seg 05/10/2026	parecer de conformidade dos Auditores; aprovação ou reprovação pelos Stakeholders

Diagrama de Gantt

Barras em vermelho estão no **caminho crítico**: qualquer atraso nelas atrasa a entrega.

SISCOORD-DC – Cronograma da equipe de Desenvolvimento

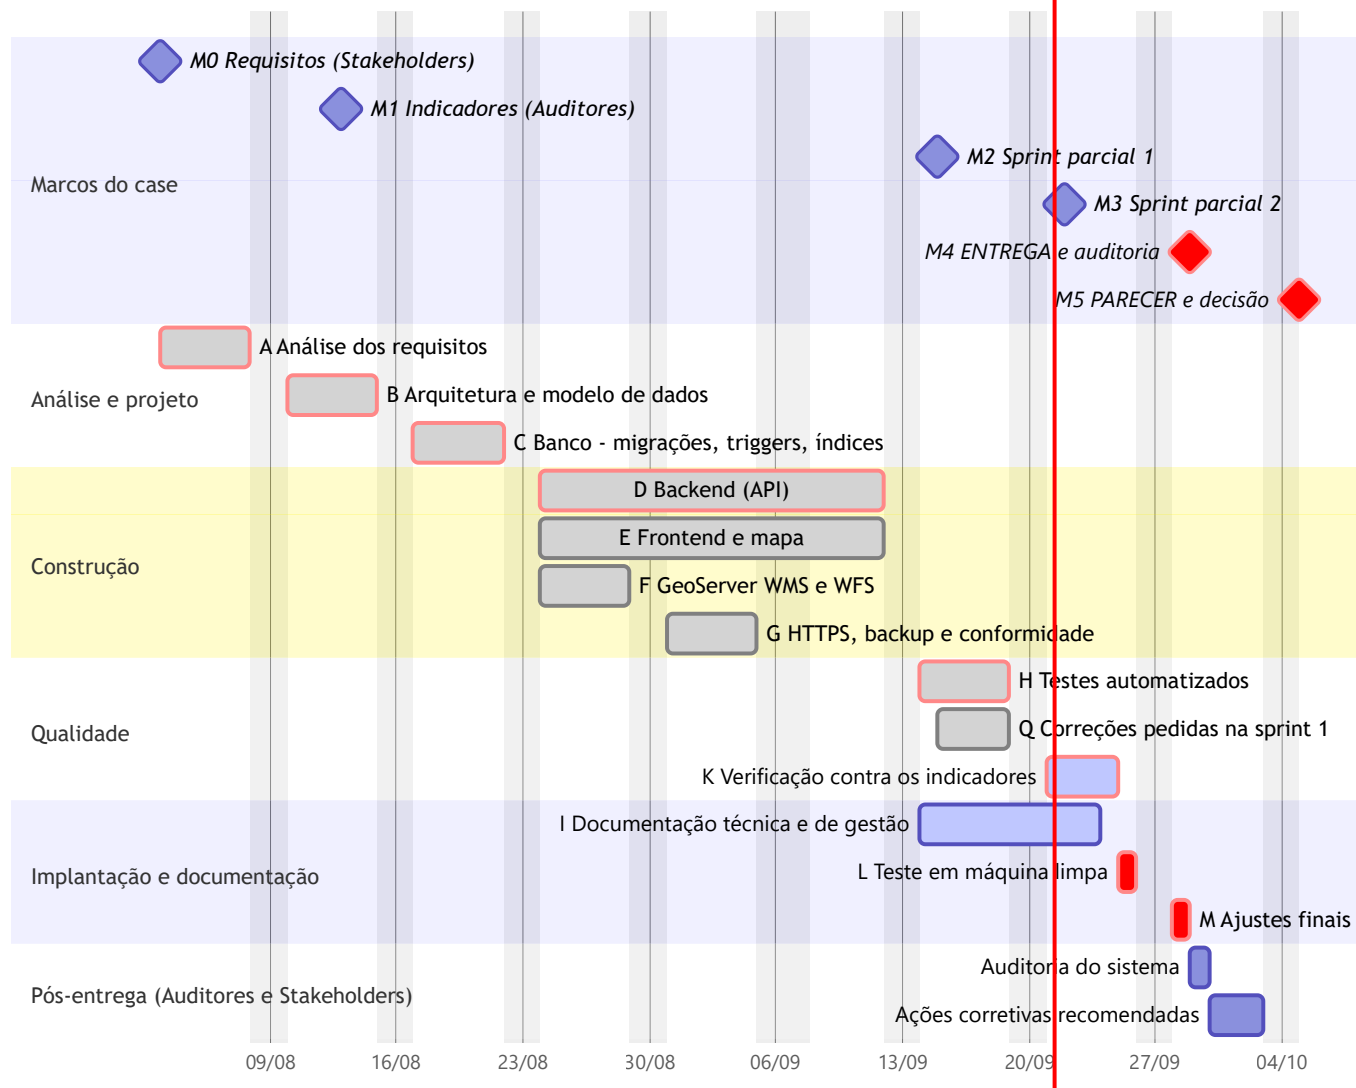


Tabela de atividades

Durações em **dias úteis**. IC / TC = início e término mais cedo; IT / TT = início e término mais tarde (contados a partir de 03/08 = dia 0). Folga = IT - IC.

ID	Atividade	EAP	Dur.	Predecessoras	Início	Término	IC	TC	IT	TT	Folga
A	Análise dos requisitos	1.2	5	—	03/08	07/08	0	5	0	5	0
B	Arquitetura e modelo de dados	1.3.1, 1.3.2	5	A	10/08	14/08	5	10	5	10	0
C	Banco: migrações, triggers e índices	1.3.3, 1.3.4	5	B	17/08	21/08	10	15	10	15	0
D	Backend (API)	1.4	14	C	24/08	11/09	15	29	15	29	0
E	Frontend e mapa	1.5, 1.6.2	14	C	24/08	11/09	15	29	16	30	1
F	GeoServer WMS e WFS	1.6.1	5	C	24/08	28/08	15	20	24	29	9
G	HTTPS, backup e conformidade	1.7	5	F	31/08	04/09	20	25	29	34	9
H	Testes automatizados	1.8.1	5	D	14/09	18/09	29	34	29	34	0
I	Documentação técnica e de gestão	1.10, 1.1	8	D, E	14/09	23/09	29	37	30	38	1
K	Verificação contra os indicadores dos Auditores	1.8.2, 1.8.3, 1.11.1	4	F, G, H	21/09	24/09	34	38	34	38	0
L	Teste de instalação em máquina limpa	1.9.3	1	K, I	25/09	25/09	38	39	38	39	0
M	Ajustes finais	1.11.2	1	L	28/09	28/09	39	40	39	40	0
—	Entrega (M4)	1.11.2	0	M	29/09	29/09	40	40	40	40	0


A atividade **Q — Correções pedidas na sprint 1** (15 a 18/09) não entra no cálculo porque não estava planejada: nasceu do retorno da sprint parcial 1 e foi absorvida em paralelo à atividade H.

Caminho crítico: A → B → C → D → H → K → L → M → Entrega = 5 + 5 + 5 + 14

- 5 + 4 + 1 + 1 = **40 dias úteis**, exatamente a janela entre os requisitos e a entrega.

Diagrama de rede (método do caminho crítico)

Cada caixa mostra IC | duração | TC em cima e IT | folga | TT embaixo. Setas e caixas em vermelho formam o caminho crítico.

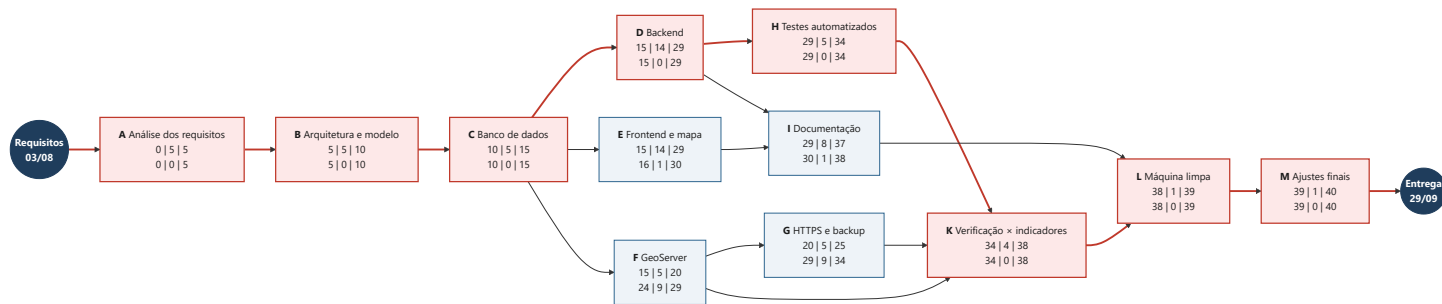

Leitura do cronograma

- **O caminho crítico ocupa os 40 dias úteis.** Não há folga entre a linha de base e a entrega; por isso as correções pedidas na sprint 1 (Q) foram feitas em paralelo aos testes, sem empurrar a verificação (K).
- **Os indicadores dos Auditores (13/08) chegaram durante o projeto (B).** O roteiro de verificação da matriz de rastreabilidade foi alinhado a eles, e a atividade K é justamente conferir cada requisito contra esses indicadores antes da entrega.
- **As sprints parciais são pontos de controle, não de entrega.** Em 15/09 e 22/09 a equipe apresenta o andamento e os Stakeholders julgam mudanças (controle de mudanças); o que eles aprovarem entra pela atividade Q ou M.
- **Depois de 29/09 o trabalho é dos Auditores e dos Stakeholders.** A equipe fica disponível de 30/09 a 02/10 para executar as ações corretivas que os Auditores recomendarem no prazo disponível, antes do parecer de 05/10.
