


Organização do projeto e matriz RACI

Organograma do projeto

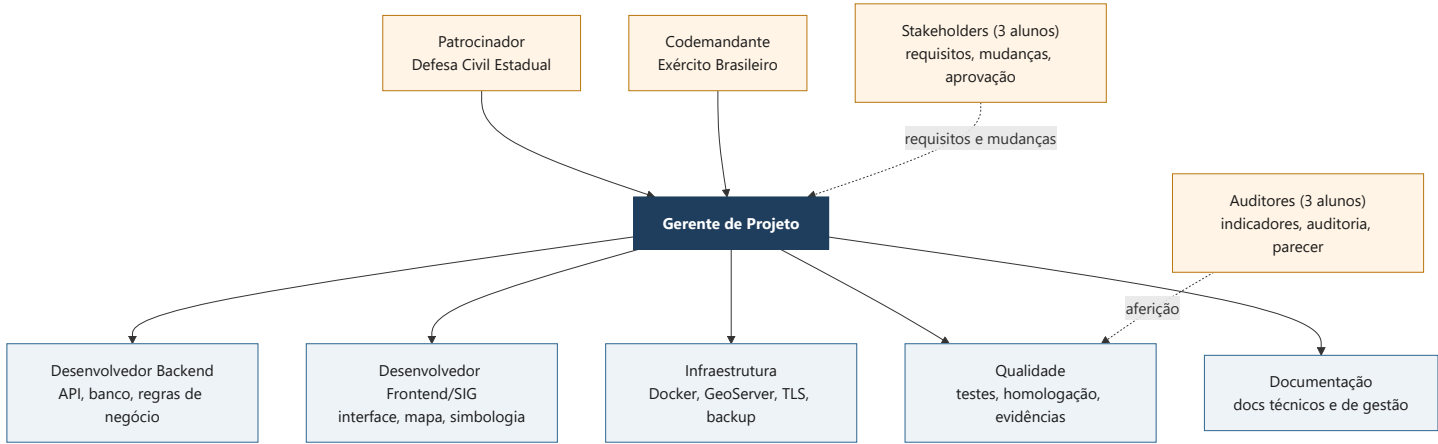

Laranja: partes externas à equipe. Linha tracejada: relação funcional (requisitos, aferição), sem subordinação.

Papéis e integrantes

Uma pessoa pode acumular papéis. Em equipe pequena, é comum juntar Backend + Infraestrutura e Qualidade + Documentação. Só **não** junte *Desenvolvedor* com *quem faz o teste em máquina limpa* (EAP 1.9.3): o RNF-07 exige alguém que não ajudou a construir o sistema.

Papel	Sigla	Responsabilidades principais	Integrante(s)
Patrocinador	PAT	aprova o termo de abertura, decide mudanças de escopo e prazo, representado pelos Stakeholders no case	Defesa Civil Estadual
Stakeholders	STK	definem os requisitos (03/08), julgam mudanças (15 e 22/09), aprovam ou reprovam a entrega (05/10)	3 alunos
Auditores	AUD	definem os indicadores (13/08), auditam a entrega (29/09), emitem o parecer de conformidade (05/10)	3 alunos
Gerente de Projeto	GP	planejamento, cronograma, riscos, comunicação, relatório de situação, pacote de entrega	(preencher)
Desenvolvedor Backend	BE	FastAPI, modelo de dados, migrações, triggers, RBAC, auditoria, SITREP, exportação	(preencher)

Papel	Sigla	Responsabilidades principais	Integrante(s)
Desenvolvedor Frontend/SIG	FE	React, Leaflet, camadas, simbologia, desenho de polígono, consumo de WMS	(preencher)
Infraestrutura	INF	Docker Compose, GeoServer, nginx/TLS, backup e restauração, ambiente de homologação	(preencher)
Qualidade	QA	testes automatizados, roteiro de homologação, medições de desempenho e carga, evidências	(preencher)
Documentação	DOC	documentação técnica (RNF-08), manual de instalação, conformidade, matriz de rastreabilidade	(preencher)

Matriz RACI

R — Responsável (executa) · **A** — Aprovador (responde pelo resultado; um por linha) · **C** — Consultado (opina antes) · **I** — Informado (sabe depois).

EAP	Entrega	PAT	STK	AUD	GP	BE	FE	INF	QA	DOC
1.1.1	Termo de abertura	A	C	I	R	I	I	I	I	I
1.1.2	Planos do projeto	I	C	I	A/R	C	C	C	C	C
1.1.3	Monitoramento e relatório de situação	I	I	—	A/R	C	C	C	C	C
1.1.4	Encerramento e lições aprendidas	A	I	I	R	C	C	C	C	C
1.2	Análise de requisitos e matriz de rastreabilidade	C	A	I	R	C	C	C	C	R
1.3	Arquitetura e banco de dados	I	C	—	A	R	C	C	I	I
1.4	API de negócio	—	—	—	A	R	C	I	C	I
1.5	Interface web e mapa	—	C	—	A	C	R	I	C	I
1.6	Interoperabilidade WMS/WFS	—	C	—	A	C	R	R	C	I
1.7	Segurança e conformidade	I	C	C	A	R	C	R	C	R
1.8.1	Testes automatizados	—	—	—	A	R	C	—	R	I
1.8.2–1.8.3	Verificações manuais, desempenho e escala	I	I	C	A	C	C	C	R	I
1.9	Implantação e teste em máquina limpa	I	I	C	A	C	I	R	R	C
1.10	Documentação técnica (RNF-08)	—	I	I	A	C	C	C	C	R
1.11.1	Homologação e evidências	I	C	C	A	C	C	C	R	I
1.11.2	Pacote de entrega (29/09)	I	I	I	A/R	C	C	C	C	C
1.11.3	Parecer e decisão (05/10)	A	C	C	R	C	C	I	I	I
—	Aprovação de mudança de escopo	A	C	I	R	C	C	C	C	I
