


Partes interessadas e plano de comunicação

Registro de partes interessadas

#	Parte interessada	Papel no projeto	Interesse principal	Poder	Interesse	Estratégia
P1	Defesa Civil Estadual	patrocinador e principal usuário	coordenar os meios entre órgãos durante chuvas extremas	Alto	Alto	gerenciar de perto
P2	Exército Brasileiro	codemandante; órgão de origem de recursos; interesse na IDE-Defesa	interoperabilidade (WMS/WFS), aderência à Portaria GM-MD nº 2.445/2021	Alto	Alto	gerenciar de perto
P3	Stakeholders (3 alunos)	definem os requisitos (03/08), julgam mudanças nas sprints (15 e 22/09) e aprovam ou reprovam a entrega (05/10)	entrega aderente aos 25 requisitos, dentro de escopo, tempo e custo	Alto	Alto	gerenciar de perto
P4	Auditores (3 alunos)	definem os indicadores (13/08), auditam a entrega (29/09) e emitem o parecer de conformidade (05/10)	evidências objetivas e sistema reproduzível	Alto	Médio	manter satisfeito
P5	Coordenadores (usuários)	operação com escrita total	cadastro de recursos confiável e trilha de auditoria	Médio	Alto	manter informado
P6	Operadores (usuários)	operação de campo	empenhar em ≤ 5 interações; mensagens de erro claras	Baixo	Alto	manter informado
P7	Usuários de Consulta	leitura da situação	mapa atualizado e SITREP	Baixo	Médio	manter informado
P8	Órgãos de origem dos recursos (CBMES, PMES, SAMU)	fornece equipes e equipamentos	ver onde seus meios estão e por quanto tempo	Médio	Médio	manter satisfeito
P9	Municípios atingidos	beneficiários indiretos	atendimento mais rápido	Baixo	Alto	manter informado (via Defesa Civil)
P10	Assessoria jurídica / compliance do órgão	valida LGPD e IDE-Defesa	conformidade legal antes da produção	Médio	Baixo	manter satisfeito
P11	Provedores de WMS externo (INDE, IBGE)	fornece camadas consumidas	nenhum (não sabem do projeto)	Baixo	Baixo	monitorar
P12	Equipe do projeto	constrói e entrega	escopo estável e prazo viável	Médio	Alto	manter informado

Matriz poder x interesse

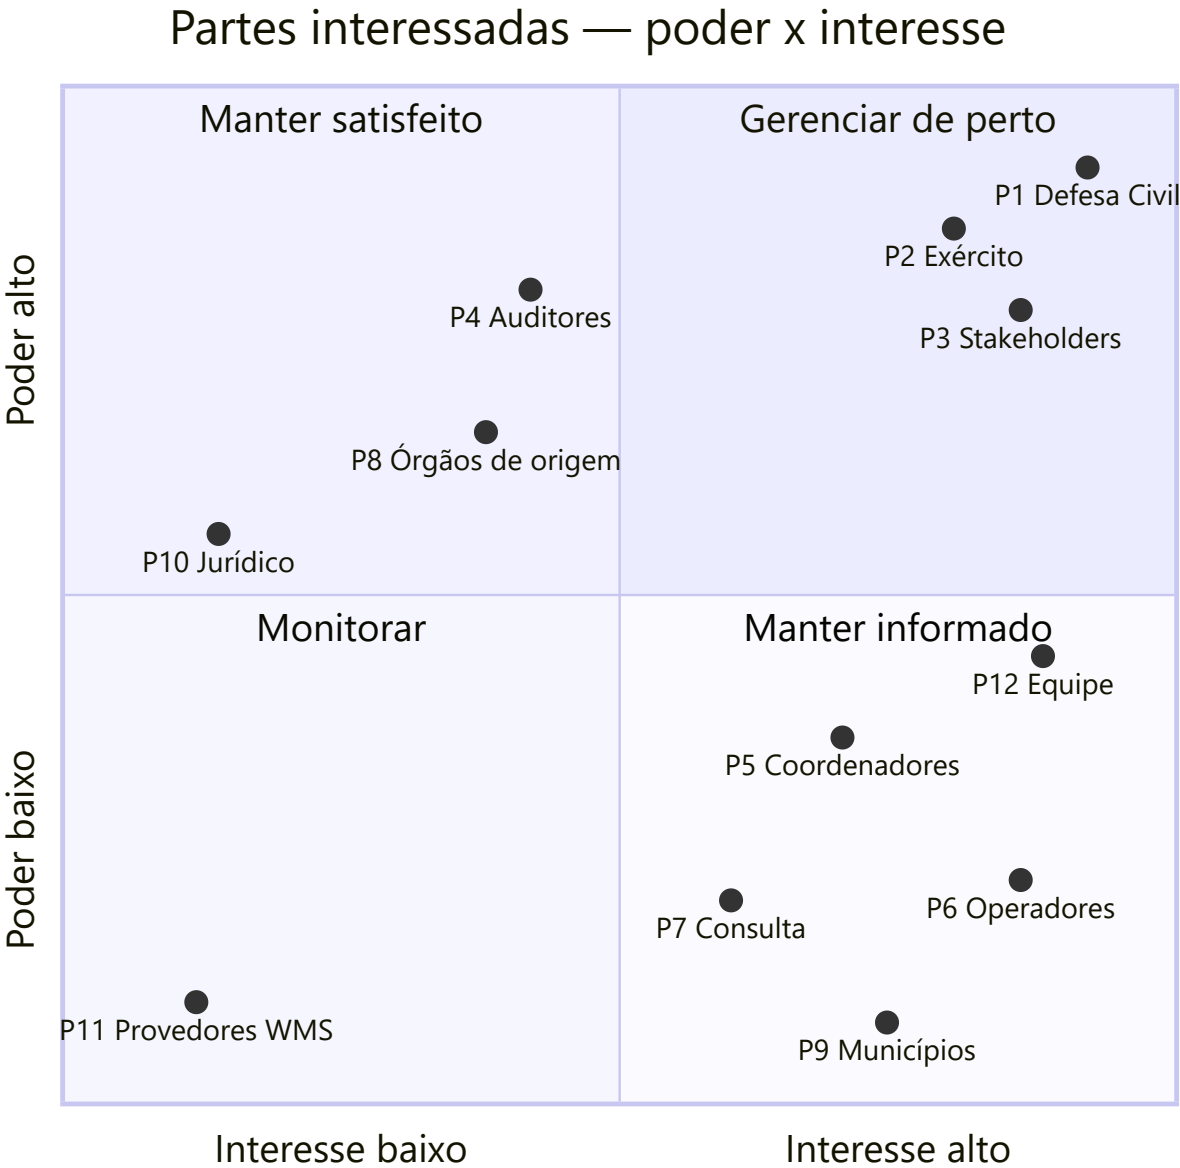

Plano de comunicação

#	Comunicação	Objetivo	Público	Frequência / data	Meio	Responsável	Registro
C1	Recebimento dos requisitos	alinhar objetivos, escopo e marcos	P3, equipe	03/08/2026	reunião (presencial ou vídeo)	GP	ata + termo de abertura
C2	Reunião semanal da equipe	acompanhar o avanço, resolver impedimentos, revisar riscos	equipe	semanal, segunda-feira	reunião curta (≤ 30 min)	GP	ata + atualização do relatório de situação
C3	Acompanhamento diário	tirar dúvidas e sinalizar bloqueios	equipe	diário	grupo de mensagens	todos	—
C4	Relatório de situação	informar o semáforo, as pendências e os riscos	P1, P2, P3	semanal, sexta-feira	e-mail com link para status-projeto.md	GP	e-mail enviado
C5	Solicitação de mudança	pedir alteração de escopo, prazo ou requisito	P3 → GP → P1	sob demanda	formulário do controle de mudanças	quem solicita	registro de mudanças
C6	Revisão técnica de código e documentação	garantir que o código e a documentação contam a mesma história	BE, FE, INF, DOC	a cada entrega relevante	<i>pull request</i> no repositório	autor da mudança	histórico do repositório
C7	Recebimento dos indicadores de auditoria	alinhar o roteiro de verificação da matriz de rastreabilidade ao framework dos Auditores	P4, QA, GP	13/08/2026	reunião	GP	roteiro de verificação
C8	Sprints parciais	apresentar o andamento; Stakeholders julgam as solicitações de mudança	P3, equipe	15/09 e 22/09/2026	apresentação	GP + desenvolvedores	ata + decisões sobre mudanças
C9	Entrega e auditoria	entregar sistema, documentação e evidências; Auditores auditam com base nos indicadores	P3, P4	29/09/2026	entrega + sessão de auditoria	GP	protocolo de entrega
C10	Parecer e decisão	ações corretivas recomendadas (30/09 a 02/10); parecer de conformidade e aprovação ou reprovação	P3, P4, equipe	05/10/2026	apresentação	GP + desenvolvedores	parecer + decisão
C11	Lições aprendidas	registrar o que repetir e o que evitar	equipe	após 05/10/2026	reunião de retrospectiva	GP	documento de lições aprendidas

Regras de comunicação

- **Escalonamento:** impedimento sem solução em 1 dia útil sobe para o GP; se afetar o caminho crítico (cronograma), o GP avisa o patrocinador no mesmo dia, sem esperar o relatório de sexta.
- **Fonte única da verdade:** requisitos → matriz de rastreabilidade; escopo → EAP; datas → cronograma. Decisão tomada em conversa só vale depois de registrada num desses documentos.

- **Dados pessoais:** relatórios e apresentações não trazem dados pessoais de usuários do sistema (LGPD — ver conformidade.md); nas demonstrações, use dados gerados por `seed_escalas.py`.
