

Relatório de situação

Campo	Valor
Data de referência	segunda, 21/09/2026 — depois da sprint parcial 1, véspera da sprint parcial 2
Equipe	Desenvolvimento (9 alunos)
Fase	verificação contra os indicadores dos Auditores (atividade K do cronograma)
Próximos marcos	sprint parcial 2 (22/09) · entrega e auditoria (29/09) · parecer e decisão (05/10)

Resumo executivo

O **desenvolvimento está concluído**: backend, frontend, banco PostGIS, publicação OGC, implantação por Docker Compose, testes automatizados e toda a documentação técnica exigida pelo RNF-08. Os 25 requisitos têm componente e forma de verificação na matriz de rastreabilidade, alinhada aos indicadores que os Auditores definiram em 13/08.

Na **sprint parcial 1 (15/09)** a revisão encontrou 4 pontos que podiam custar requisitos na auditoria (Q1 a Q4). Os quatro foram **corrigidos entre 15 e 18/09**, com testes automatizados novos, e não houve mudança de escopo.

Em 21/09 o sistema foi **implantado com Docker Compose** e verificado: os 6 containers sobem, a API responde por HTTPS, o WMS recusa acesso sem login (401) e, com login, publica `recursos` e `ocorrencias` em EPSG:4674. A suíte automatizada foi executada no mesmo ambiente: **36 testes, todos passando**, incluindo os das correções da sprint 1. Código e documentação estão em https://github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG.


Falta, até 29/09: reunir as evidências por indicador dos Auditores e fazer o teste de instalação por alguém de fora da equipe.

Semáforo

Dimensão	Situação	Comentário
Escopo	●	25/25 requisitos com componente implementado; nenhuma mudança de escopo aprovada nas sprints
Cronograma	●	tudo no prazo, mas o caminho crítico (K → L → M) ocupa os 6 dias úteis até a entrega
Qualidade	●	36 testes automatizados passando (14 requisitos cobertos); 11 requisitos dependem de verificação manual, com evidência em montagem
Riscos	●	3 riscos altos: evidências (R03), conhecimento concentrado (R02), instalação em máquina limpa (R01) — ver riscos
Custos	●	somente software livre; sem custo de licença

Avanço da EAP


Desenvolvimento de trabalho da EAP por situação (40 pacotes)

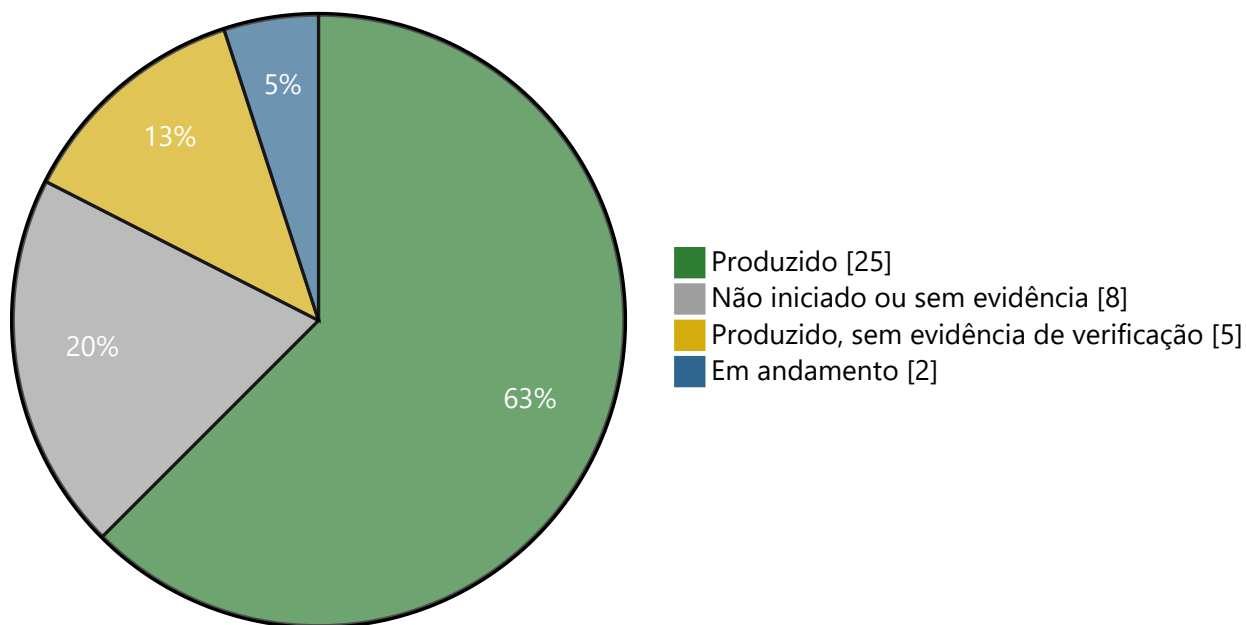

Detalhe por pacote: dicionário da EAP.

Cobertura de verificação

Cobertura de verificação no cada requisito é verificado (25 requisitos)

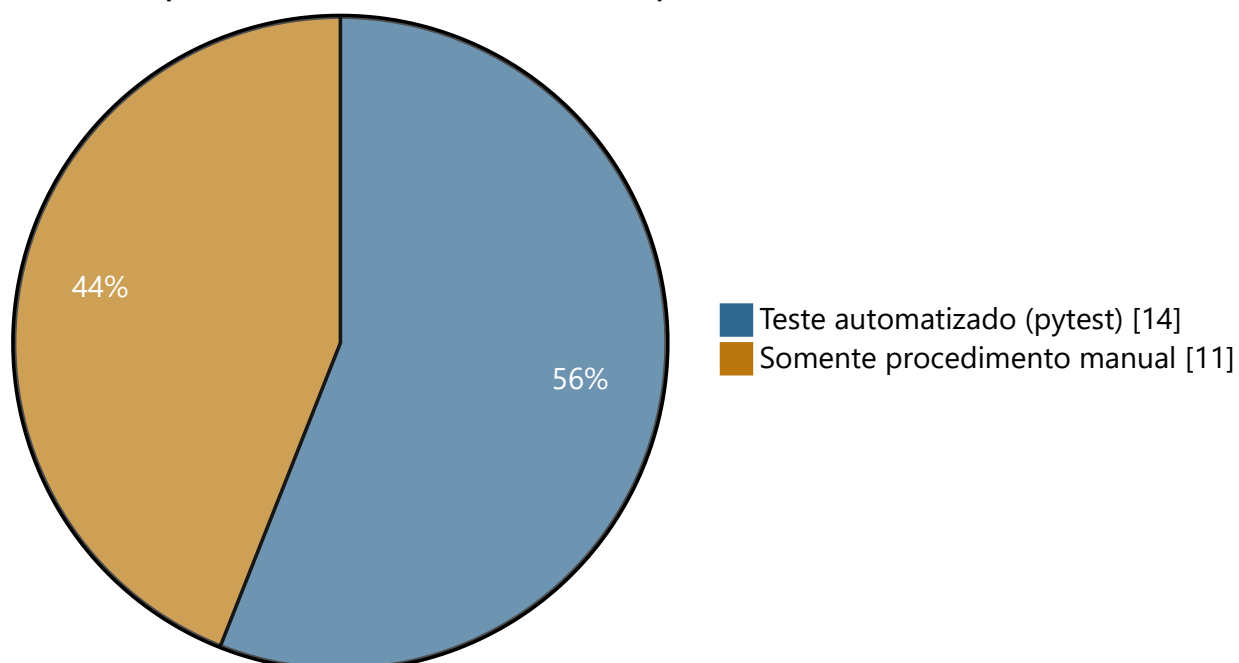

Dos **19 obrigatórios**, 11 têm teste automatizado e 8 dependem de procedimento manual. A relação completa, requisito a requisito, está na matriz de rastreabilidade.

Correções feitas após a sprint parcial 1

ID	Problema encontrado	Requisito	Correção (15 a 18/09)
Q1	API e GeoServer acessíveis em HTTP puro pela rede	RNF-06	portas publicadas só no loopback; documentação da API em <code>https://<host>/api/docs</code>
Q2	WMS/WFS do GeoServer sem login	RNF-09, RF-11	nginx consulta a API antes de cada acesso; só usuário ativo passa (sessão do mapa, QGIS com e-mail e senha, ou token)
Q3	Nenhuma camada WMS externa cadastrada e nenhuma tela de cadastro	RF-15	tela "Camadas externas" e camada de exemplo "Hidrografia (IBGE)"
Q4	Tabela <code>camadas_externas</code> sem trilha de auditoria	RF-13	migração 0002 estende a auditoria; teste cobre inclusão e alteração

Próximos passos até a entrega

Data	Ação	Responsável
✓ seg 21/09	sistema implantado em Docker e verificado; <code>pytest</code> : 36 testes passando; código publicado no GitHub	Backend · Gerente de projeto
ter 22/09	repasso do código para a equipe	Gerente de projeto
ter 22/09	sprint parcial 2: apresentar correções, testes e documentação; Stakeholders julgam eventuais mudanças	toda a equipe
21 a 24/09	verificação de cada requisito contra os indicadores dos Auditores, com evidência nomeada por requisito; medições de desempenho (RNF-04) e carga (RNF-10)	Qualidade
sex 25/09	teste de instalação em máquina limpa por alguém de fora da equipe, cronometrado (RNF-07)	Infraestrutura
seg 28/09	ajustes finais e fechamento do pacote de entrega	toda a equipe
ter 29/09	entrega e auditoria	Gerente de projeto
30/09 a 02/10	executar as ações corretivas recomendadas pelos Auditores	toda a equipe
seg 05/10	parecer de conformidade e aprovação ou reprovação	Auditores · Stakeholders

Lições aprendidas (preliminares)

#	O que aconteceu	Lição
L1	A documentação de gestão foi consolidada depois do desenvolvimento	publicar EAP, cronograma e riscos logo após receber os requisitos (03/08)
L2	A folga entre o fim do desenvolvimento e a entrega é pequena	começar a verificação contra os indicadores dos Auditores (13/08) durante o desenvolvimento, não só no fim
L3	Os requisitos mais críticos (duplo empenho, auditoria não editável) foram garantidos no próprio banco	resolver requisitos críticos "por construção", e não só por convenção de código
L4	Q1 a Q4 só apareceram quando alguém leu o código contra os documentos	fazer revisão cruzada (código × requisito × documentação) antes de cada sprint
