


Controle de mudanças

A linha de base de escopo é o **Documento de Requisitos v2.0 (03/08/2026)**, decomposto na EAP. Qualquer alteração em requisito, escopo, prazo ou critério de aceite passa por este fluxo antes de virar código.

O que não passa por aqui: correção de defeito que faz o sistema cumprir um requisito que *já* estava na linha de base (por exemplo, os riscos R07, R09 e R14 em riscos.md). Isso é trabalho da EAP 1.8/1.11 e segue direto para correção, só com registro no relatório de situação.

Fluxo

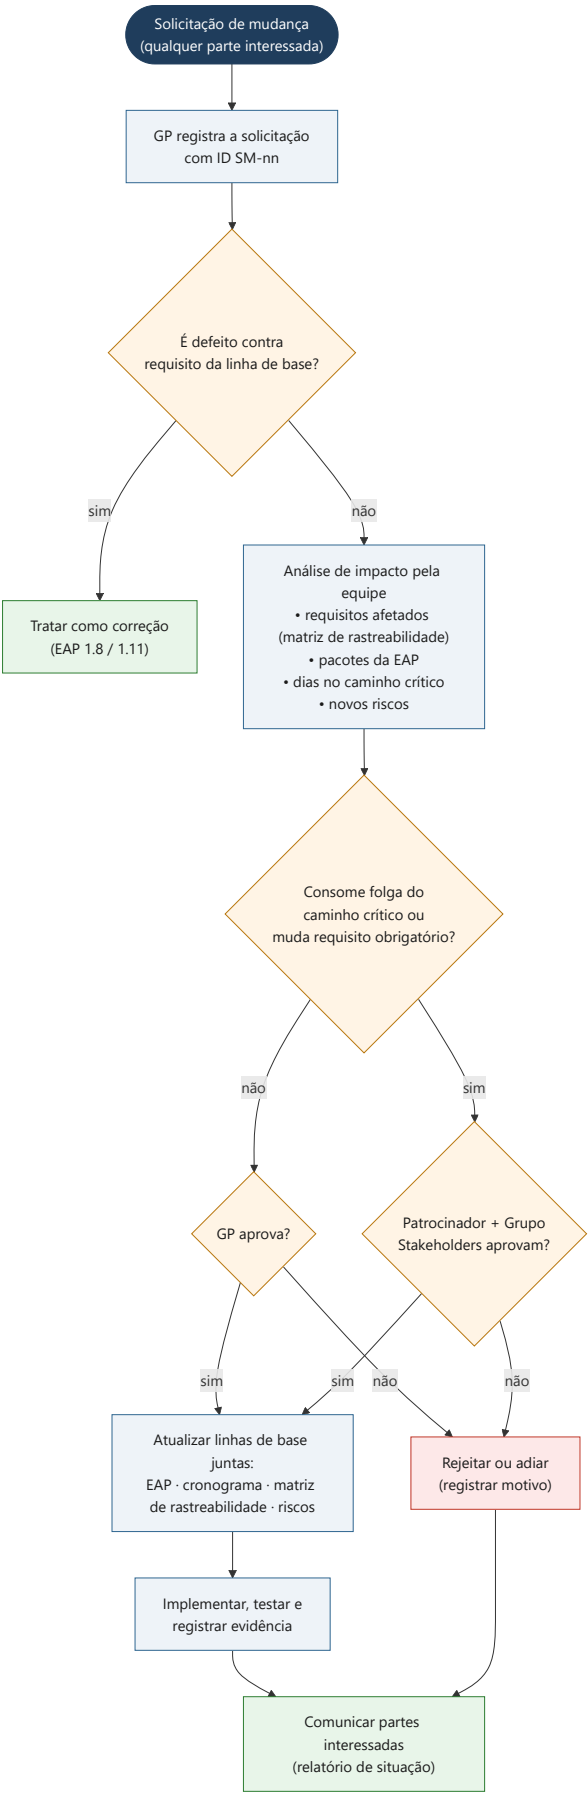

Alçadas de aprovação

Tipo de mudança	Quem aprova
Ajuste interno sem efeito em requisito, prazo ou caminho crítico (ex.: reordenar atividades com folga)	Gerente de Projeto
Mudança em requisito desejável , ou que consome folga de atividade fora do caminho crítico	Gerente de Projeto, informando os Stakeholders
Mudança em requisito obrigatório , na data de entrega, ou que consome o caminho crítico	Stakeholders (julgamento nas sprints de 15/09 e 22/09)

Congelamento de escopo: a partir da **sprint parcial 1 (15/09/2026)** (fim do desenvolvimento), só entram mudanças que corrijam defeito ou que o patrocinador classifique como impeditivas para a decisão.

Formulário de solicitação de mudança

Copie o bloco abaixo para uma *issue* no repositório ou para o registro de mudanças.

ID: SM-__

Data: _____ Solicitante: _____

Tipo: ☐ requisito ☐ escopo ☐ prazo ☐ critério de aceite

Descrição da mudança: _____

Justificativa: _____

Análise de impacto (equipe) ---

Requisitos afetados (RF/RNF): _____

Pacotes da EAP afetados: _____

Esforço estimado (dias úteis): _____

Efeito no caminho crítico: ☐ nenhum ☐ consome folga ☐ atrasa entrega

Novos riscos: _____

Decisão ---

☐ aprovada ☐ rejeitada ☐ adiada Por: _____ Data: _____

Motivo: _____

Documentos atualizados: ☐ EAP ☐ cronograma ☐ matriz de rastreabilidade ☐ riscos

Registro de mudanças

ID	Data	Solicitante	Descrição	Impacto	Decisão	Data da decisão
—	—	—	nenhuma mudança de escopo aprovada nas sprints; as correções de 15 a 18/09 foram defeitos contra a linha de base	—	—	—
